

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Капитальный ремонт кровли здания структурного подразделения «Дом культуры «Красный холм» муниципального учреждения «Дом культуры «Гармония»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Исползовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Итого
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения г*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения г*	Всего		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	13=5-9	
8 040 000,00	7 638 000,00	321 600,00	80 400,00	6 713 386,82	6 377 717,48	268 535,47	67 133,87	6 713 386,82	-	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 29.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 12.11.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 6 листах: фотографии объекта до начала работ, промежуточные этапы выполнения и по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Фандеев Ю.В. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа:


Болотников А.В. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.


Дата «19» ноября 2021 г.




Фотографии до проведения ремонта

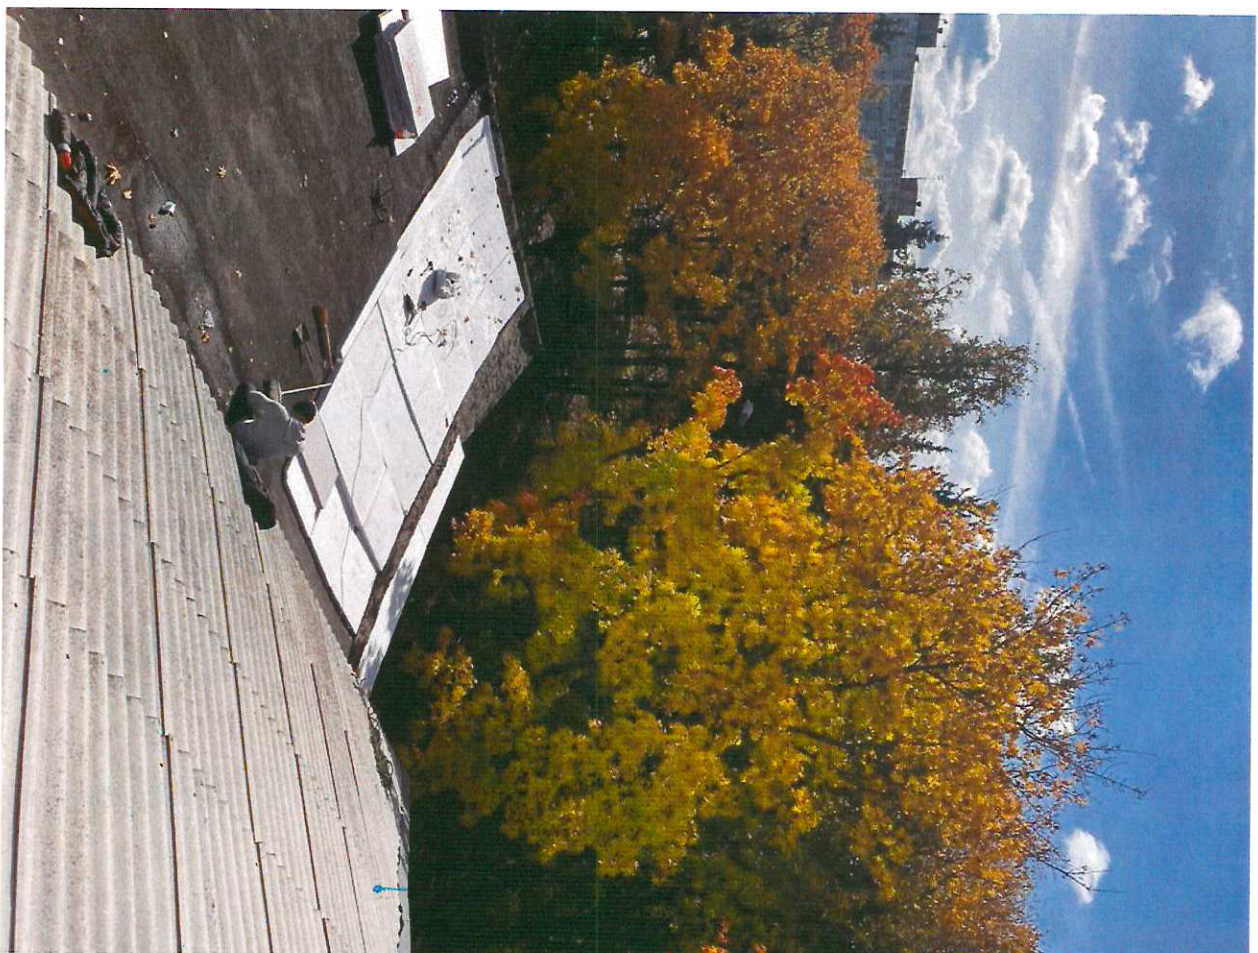


Приложение

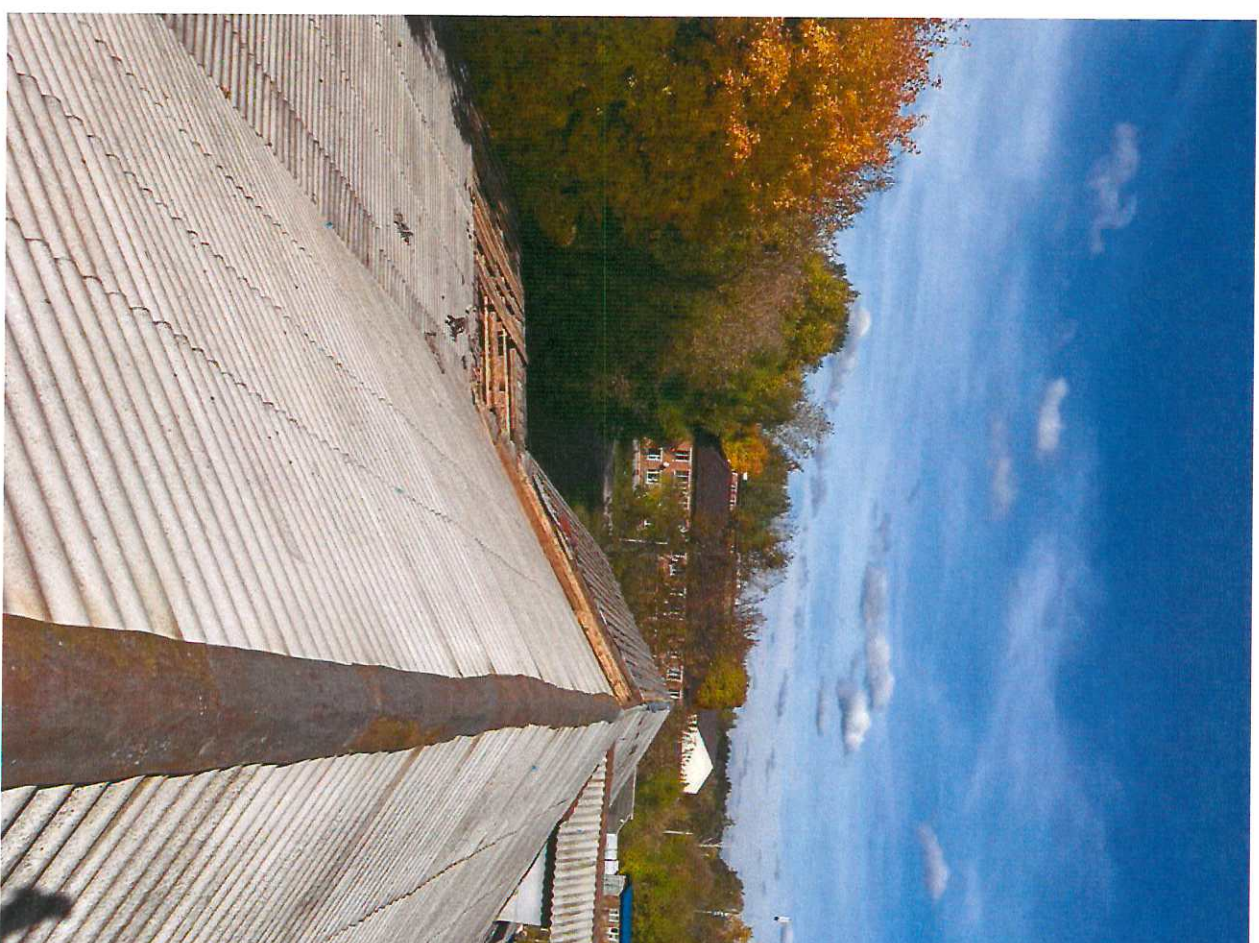

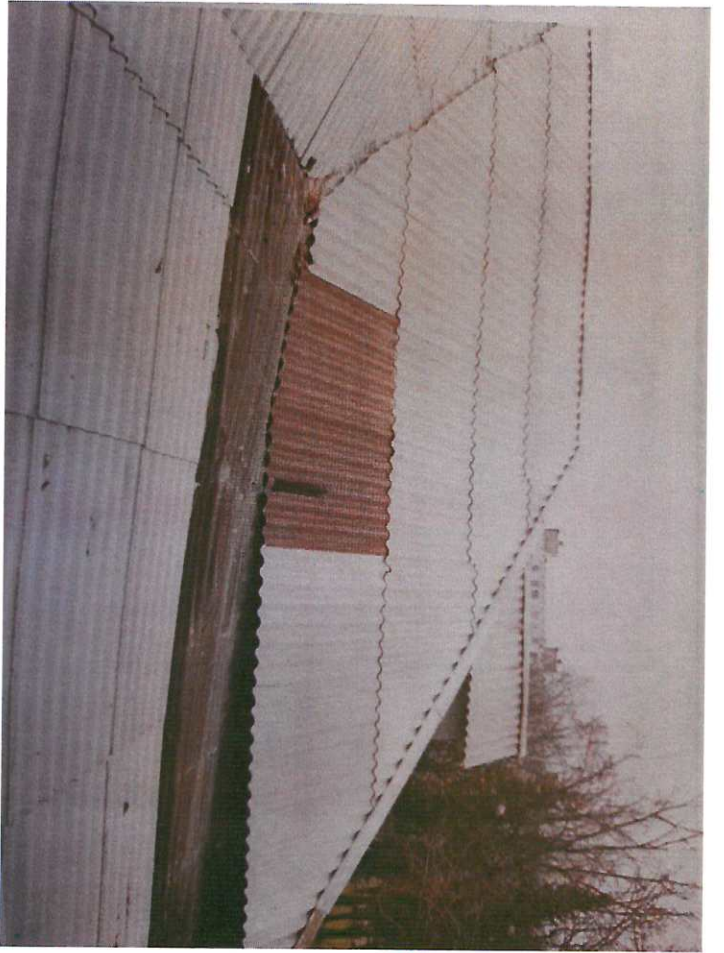



Фотография хода работ

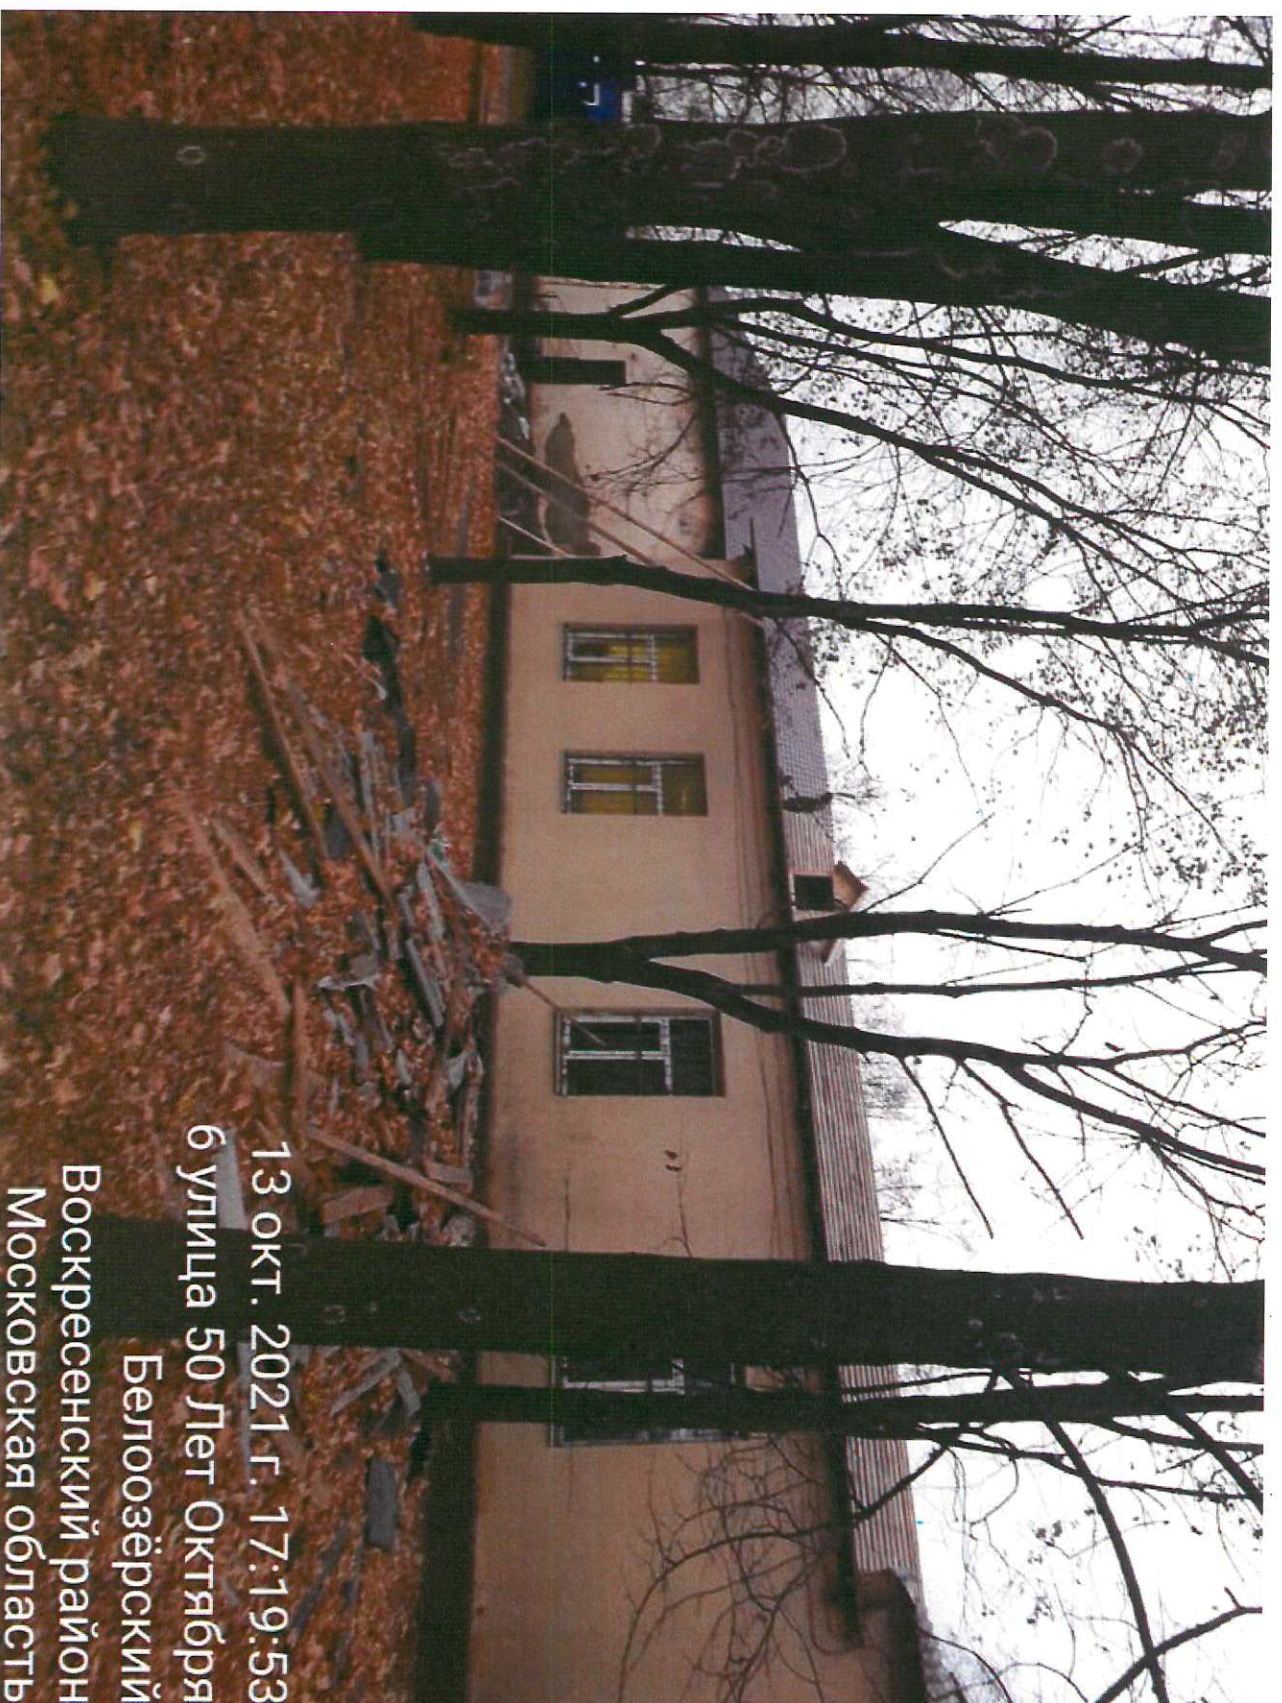

13 окт. 2021 г. 17:19:53
6 улица 50 Лет Октября
Белоозёрский
Воскресенский район
Московская область

Фотографія після проведення ремонту



